TED 7503



Este formulário objetiva captar informações sobre a execução do Termo de Execução Descentralizada – TED, para que seja efetuada a prestação de contas do objeto.

Prestação de Contas é a demonstração de que os recursos transferidos por meio do TED cumpriram as metas previstas no Plano de Trabalho dentro do prazo determinado.

Nas próximas páginas solicita-se o preenchimento de:

1) Formulário de prestação de contas (com 8 perguntas).

INSTRUÇÕES PARA ENTREGA:

Encaminhar por e-mail dois documentos: Documento assinado, digitalizado e salvo em PDF; Documento em arquivo editável (*.Doc); Entrega definitiva da obra; Relatório de Fotos da obra.

PRAZO PARA ENTREGA: 19/08/2019



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TED 7503

[1] EXECUÇÃO DO OBJETO

Houve cumprimento TOTAL (X) Houve cumprimento PARCIAL () Houve devolução integral ()

[2] ATIVIDADES PREVISTAS

- a Montagem das sapatas para acomodação da sala modular realizada pela equipe do Departamento de Serviços de Apoio, possibilitando a imediata instalação da sala modular.
- b Montagem da sala modular em local designado conforme acertado com a empresa.

[3] META PREVISTA

Aquisição de 01 (uma) sala modular de 72 m² para readequação do espaço da biblioteca do Centro de Referência de Campo Verde – CRCV do IFMT Campus São Vicente, através de Adesão ao Pregão Eletrônico (02/2017 da UG 158144) com preço registrado até 29/08/2018, qual será destinada para: 1. Readequar o espaço da biblioteca do CRCV para atender as necessidades mínimas de instalações físicas suficientes para o acervo dos cursos de agronomia e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e para prover serviços aos usuários, como salas individuais de estudo, acessibilidade e segurança.

Descrição da sala: Fornecimento e montagem de sala de aula modular com dimensões 6m x 12m (variação +/- 5%) com 3 m de altura interna (05 módulos). Deverá existir 01 porta de alumínio, com 0,90 m de largura e 2,10 m de altura e 05 (cinco) janelas de alumínio na cor branca, do tipo de correr, com 4 (quatro) folhas e dimensões de 2,20 x 1,00 m. Sala deverá conter 2 aparelhos de ar-condicionado tipo Split de no mínimo 24.000 btu's, incluso a instalação elétrica (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA DA REFERIDA LICITAÇÃO).

[4] ATIVIDADES EXECUTADAS

- 1 Perfuração do solo para confecção das sapatas
- 2 Enviar para empresa o esboço da montagem da sala, conforme abaixo, identificando a posição das aberturas e a localização desta em relação ao terreno e prédios existentes:

Acervo Biblioteca

2m

Preciso que esta porta fique distante da parede 2 metros




- 3 entrega dos blocos para montagem da sala modular;
- 4 Instalação da Sala Modulares;
- 5 Recebimento da sala modular pelo Diretor do Centro de Referência e ateste da nota fiscal

[5] META EXECUTADA

Todas as etapas previstas foram cumpridas. A seguir são apresentadas as fotos da área interna e externa.





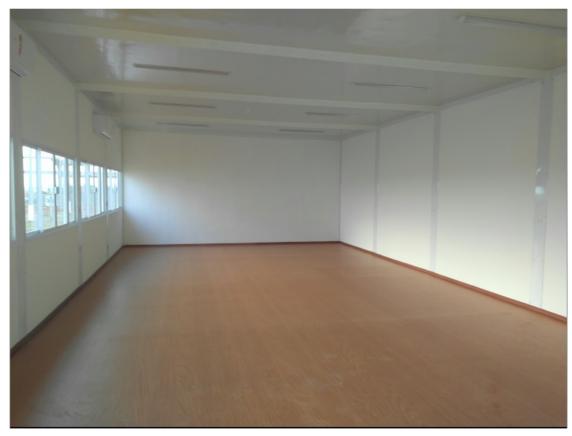








[6] DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO

O empenho foi realizado no dia 26 de julho, servindo este como ordem de serviço para a contratada iniciar as atividades. Quando foi montado o plano de trabalho acreditava-se que a entrega seria em dois meses. Ocorre que a confecção das salas demora mais do que isso. A partir de conversas via e-mail mostradas abaixo, fomos acertando a data de entrega de forma que não prejudicasse as atividades letivas, em as demais entregas que a licitante havia marcado com demais campi do IFMT:



[7] MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO OBJETO

Agendamento de entrega das salas de forma a não prejudicar as demais entregas de salas modulares do IFMT, permitindo que a empresa pudesse realizar as instalações nos demais campi contratante e que pudesse chegar para nos atender no momento mais oportuno sem prejuízos das atividades letivas.

[8] COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Abaixo segue a nota fiscal. O valor da Nota é igual a duas vezes o valor empenhado de uma sala modular. Isso ocorre porque a empresa construiu uma sala para o campus São Vicente, onde o campus arcou com os custos utilizando sua fonte 0112 para o custeio dessa segunda sala modular. Por isso, também enviaremos cópia do empenho da sala que foi custeada pelo campus.

SERVICO PUBLICO FEDERAL SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

: 06Dez17 NUMERO: 2017NE800427 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA EMISSAO EMITENTE : 158335/26414 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SHO VICENTE

: 10784782/0005-84 FONE: 65-3341-2135 CNPJ

ENDERECO : RODOVIA BR 364 KM 329

MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78106-970

CREDOR : 02807490/0001-68 - POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP ENDERECO : BANANAL 4060 BANANAL DO CUI

ENDERECO : BANANAL 4060 BANANAL DO SUL MUNICIPIO : 8319 - SAO FRANCISCO DO SUL

UF: SC CEP: 89270-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVAÇÃO / FINALIDADE

AQUISICAO DE SALA MODULAR (CONTAINER) PARA O CAMPUS SAO VICENTE. ADESAO SRP 02/2017 - UASG: 158144 - ITEM 02. PROCESSO N. 23197.038766.2017-69. PROC ORIGEM: 05000022017

CLASS: 1 26414 12363208020RL0051 108871 0112000000 449052 158335 L20RLP6001N

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO AMPARO: PROCESSO: 23188039365201654 AMPARO:

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT / ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 169.500.00

CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS********************************** ************* ***************** **************

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 51 -PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV

1 VALOR UNITARIO: SEQ.: 1 QUANTIDADE: 169.500,00 VALOR DO SEQ. : 169.500,00

1,00000 UNIDADE

CONTAINER

CONTAINER, NOME CONTAINER

MARCA: POLIBOX ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000037494

TOTAL:

169.500,00

FABIO HENRIQUE DE O.SILVA ORDENADOR SUBSTITUTO

> Fábio H. de Oliveira Silva Substituto do Diretor-Beral IFMT Climpus São Vicente Port. nº 987- II do 94/05/2017

CARLINI FRANCIELLY K

GESTOR FINANCEIRO

Proncinity Karoline Aires Carlini

SERVICO PUBLICO FEDERAL SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

: 24Jul18 NUMERO: 2018NE800243 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA EMISSAO EMITENTE : 158335/26414 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SHO VICENTE

: 10784782/0005-84 FONE: 65-3341-2135

ENDERECO : RODOVIA BR 364 KM 329 MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78106-970

: 02807490/0001-68 - POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP CREDOR

ENDERECO

: BANANAL 4060 BANANAL DO SUL : 8319 - SAO FRANCISCO DO SUL UF: SC CEP: 89270-000 MUNICIPIO

TAXA CAMBIO:

OBSERVAÇÃO / FINALIDADE

AQUISICAO DE SALA MODULAR (CONTAINER) PARA O CAMPUS SAO VICENTE.

ADESAO SRP 02/2017 - UASG: 158144 - ITEM 02 - TED 7503. PROCESSO N. 23197.038766.2017-69. PROC ORIGEM: 05000022017

CLASS: 1 26101 12363208020RG0001 111523 8108000000 449052 158335 LPP02P0125N

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

INCISO: PROCESSO: 23188039365201654 AMPARO: LEI10520

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

NUM. ORIG.: LEI10520/02 REFERENCIA: ART01

169.500,00 VALOR ORIGINAL :

CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS********************** *********

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 51 -PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV

169.500,00 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO:

VALOR DO SEQ. :

169.500,00

1,00000 UNIDADE

CONTAINER

CONTAINER, NOME CONTAINER

MARCA: POLIBOX ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000037494

antos Weigel

TOTAL:

169.500,00

LIVIO DOS SANTOS WOCE

ORDENADOR

FRANCIELLY K. A. CARLINI

GESTOR FINANCEIRO

Francicky harmine fires Carlini Oiretora de Administração e Planejamento Port. 132 VIII de 31/01/2013

NOTA FISCAL	Nº 464 Série 1	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA RUA BANANAL, 4060 BANANAL DO SUL GUARAMIRM 473378688 89270-000 SSPAÇÓS WOZULARÍS NATUREZA DA OPERĄĆÃO SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA BY ENTREGA FUTURA DNCEIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO							DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÓNICA 0 - Entrada 1 - Saída N° 464 Série 1 1 de 1 CNP1 02.807.4900001-68				CHAVE DE ACESSO 4219 0302 8074 9000 0168 5500 1000 0004 6419 8343 2689 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
DATA DA EMISSÃO 05/03/2019	VALOR TOTAL 339,000,00	254004547 DESTINATÁRIO / F NOME / RAZÃO SOCIL INSTITUTO FEDER ENDEREÇO ROD BR 364, 329 MUNICÍPIO CUIABA	SAO VICENTE	Е				ONE /FAX 533412121	В	AIRRO/DISTRITO ILA SAO VICENTE		CNPJ/CPF 10.784.782/0005-84			1925891 - 05/03/2019 16:06:59 4 CEP 78106-970			DATA DA EMISSÃO 05/03/2019 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 05/03/2019 HORA DA SAÍDA 16:06:54				
ENOS DE FOLBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA OS PRODUTOS EQUI SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO TE DE RECEBLABENTO: INSTITUTO FEDERAL. DE MATO GROSSO - CAMPUS NAO VICENTE	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEREDOR	FATURA / DUPLICATA FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO VALOR 001 05/04/2019 339.000,00 CÁLCULO DE IMPOSTOS BASE DE CÁLCULO DO KMS 0,0				FATURA/DUPLICA	/DUPLICATA VENCIMENTO			BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VENCIMENTO VALOR DO ICMS SI	VALOR		RA / DUPLICATA VENCIM VALOR TOTAL DOS PRO					
		VALOR DO FRETE TRANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCIA ENDEREÇO QUANTIDADE 0	0.0 VALOR DO DESCONTO MARCA				0,0	0 - MI	0,0		VALOR DO IPI 160 ANTT PLACA DO VEÍCE PESO BRUTO		CULO	UF CNPJ UF INSCRIÇÃO ESTADU PESO LÍQUIDO			339.000,00					
		DADOS DOS PROD COD. PRODUTO	UTOS/SERVIÇOS DESCRIÇÃO PRODUTO/SE SALA DE AULA MODULAR		I (72,0M)		NCM/SH 94069090		O41	UN	QNTDE 2,000	VL_UNITÁRIO 00 169.500,0000		VLTOTAL	BC ICMS SUBS TRIB	VL ICMS SUBS TRIB	BCK	CMS	VL ICMS	VI. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5432 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA DE MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA. NOTA DE EMPENHO NUMERO: 2017NE800427 E 201						18NE800	BASE DE CÁLCULO DO ISSON RESERVADO AO FISCO				VALOR DO ISSQN									

Cuiabá, 21/08/2019

Atenciosamente,
