



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MEC - SETEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO  
CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TED 7505**

**Execução do Objeto:**

Houve cumprimento (X) TOTAL; ( ) PARCIAL

**Atividades Previstas:**

Aquisição de 01 (uma) sala de aula através do sistema construtivo modular por meio da participação no Pregão Eletrônico (02/2017 - UG 158144).

As salas serão destinadas ao atendimento das turmas dos cursos superiores em fase de implantação de Engenharia de Controle e Automação e para as turmas de Cursos Técnicos Integrados ao Nível Médio, visto que todas as nossas salas de aula estão ocupadas.

**Meta Prevista:**

Aquisição sala de aula modular para instalação no IFMT Campus Primavera do Leste, conforme endereço: Avenida Dom Aquino, 1500 Parque Eldorado - CEP: 78.850-000 – PVA. DO LESTE.

**Atividades Executadas:**

Fornecimento e montagem de sala de aula modular com dimensões 6m x 12m, com 3 m de altura interna. Este módulo contém: 01 porta de alumínio, com 0,90 m de largura e 2,10 m de altura e 05 (cinco) janelas de alumínio na cor branca, do tipo de correr, com 4 (quatro) folhas e dimensões de 2,20 x 1,00 m, 2 aparelhos de ar condicionado tipo Split de 24.000 btu's, incluso a instalação elétrica em pleno funcionamento.

**Meta Executada:**

Houve a execução total com a devida montagem do objeto sendo entregue em perfeitas condições de uso o seguinte item:

- 01 sala modular de 72m<sup>2</sup>, com dimensão externa de 6mx12m e altura interna de 3m;
- 01 porta de alumínio, com 0,90m x 2,10m, 5 janelas de alumínio na cor branca;
- Instalação elétrica e vídeo para instalação de projetor no teto, mais 6 pontos de tomadas duplos;
- 2 aparelhos de ar condicionados split 24.000 btus;
- Sistema de iluminação em pleno funcionamento.

**Dificuldades Encontradas na Execução da Descentralização:**


Quando do recebimento provisório do objeto pelo Engenheiro Eletricista/PRODIN alguns

apontamentos foram realizados decorrente da utilização de material elétrico divergente do referido no termo de referência.

**Medidas Adotadas para Sanar as Dificuldades de Modo a Assegurar o Cumprimento do Objeto:**

A empresa foi notificada a realizar o devido reparo e cumprimento do termo de referência, de modo que foi atendido.

Primavera do Leste, 21/08/2019.

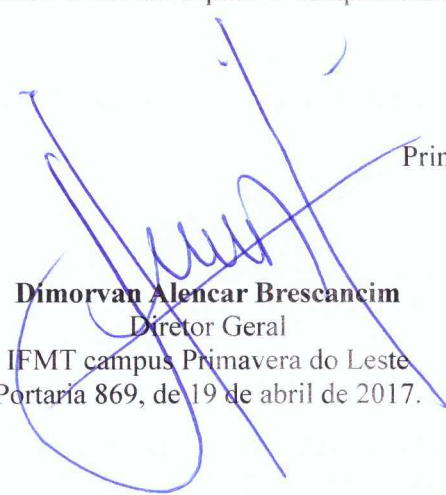

**Dimorvan Alencar Brescancim**  
Diretor Geral  
IFMT campus Primavera do Leste  
Portaria 869, de 19 de abril de 2017.
